

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 1/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-88*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-88 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: ООО ТГК-2 Энергоремонт, Назаров Игорь Николаевич*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

1. Производство работ Концессионером осуществляется на двух участках распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88:

- от ск8 до ввода в многоэтажный жилой дом по ул. Пушкина, 40 – ориентировочно 210 п.м. тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

- от ск1 до ввода в многоэтажный жилой дом по ул. Ленина, 90 – ориентировочно 50 п.м. тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Суммарная протяжённость участков производства работ на контролируемом объекте не соответствует плану выполнения мероприятий по Графику - в плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 4036,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 1972,0 п.м., в сентябре 2064,0 п.м.).

2. На участке ск8—ск12 новая трассировка теплосетей не соответствует плану паспорта БТИ – прокладка предполагается без использования камеры ск11, П-образный компенсатор на участке ск8-ск11 развёрнут в сторону дорожного полотна по ул. Пушкина (по плану БТИ д.б. развёрнут в сторону жилого массива).

3. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88 не представлена (отсутствует).

**Требования к Концессионеру:**

по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (производство работ и ввод в эксплуатацию утверждённых Графиком участков распределительных тепловых сетей).

по п2. Изменение трассировки тепловых сетей на участке ск8-ск12 – без ввода сетей в ск11, изменение расположения П-образного компенсатора, обосновать комплектом исходно-разрешительной и проектной документации. При наличии обоснованного проектной документацией решения, провести демонтаж выводимых из эксплуатации элементов тепловой сети и списание в соответствии с постановлением Администрации г. Костромы №1386 от 03.08.2009 г., иными действующими нормативно-техническими актами, внести необходимые изменения в паспорт БТИ на объект учёта (распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-88).

по п3. Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля, (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.


**Прилагаемые к акту документы:**

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения
2. Фотографии с места производства работ от 20.09.2019 г.

**Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:**


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      Евтухов А.В)  
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      Чернов Д.А.)  
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      Шахов А.В.)  
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)

## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №1/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:



№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88 в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Изменение трассировки тепловых сетей на участке ск8-ск12 – без использования камеры ск11, изменение расположения П-образного компенсатора, отсутствие камер ск12, ск12а на участке тепловых сетей ск11-ск13 обосновать комплектом исходно-разрешительной и проектной документации.	С момента получения настоящего предписания	Концессионер
3	При наличии обоснованного проектной документацией решения, провести демонтаж выводимых из эксплуатации элементов тепловой сети и списание в соответствии с постановлением Администрации г. Костромы №1386 от 03.08.2009 г., иными действующими нормативно-техническими актами, внести необходимые изменения в паспорт БТИ на объект учёта (распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-88)	В соответствии с установленными сроками на выполнение необходимых	Концессионер
4	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер



Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи)



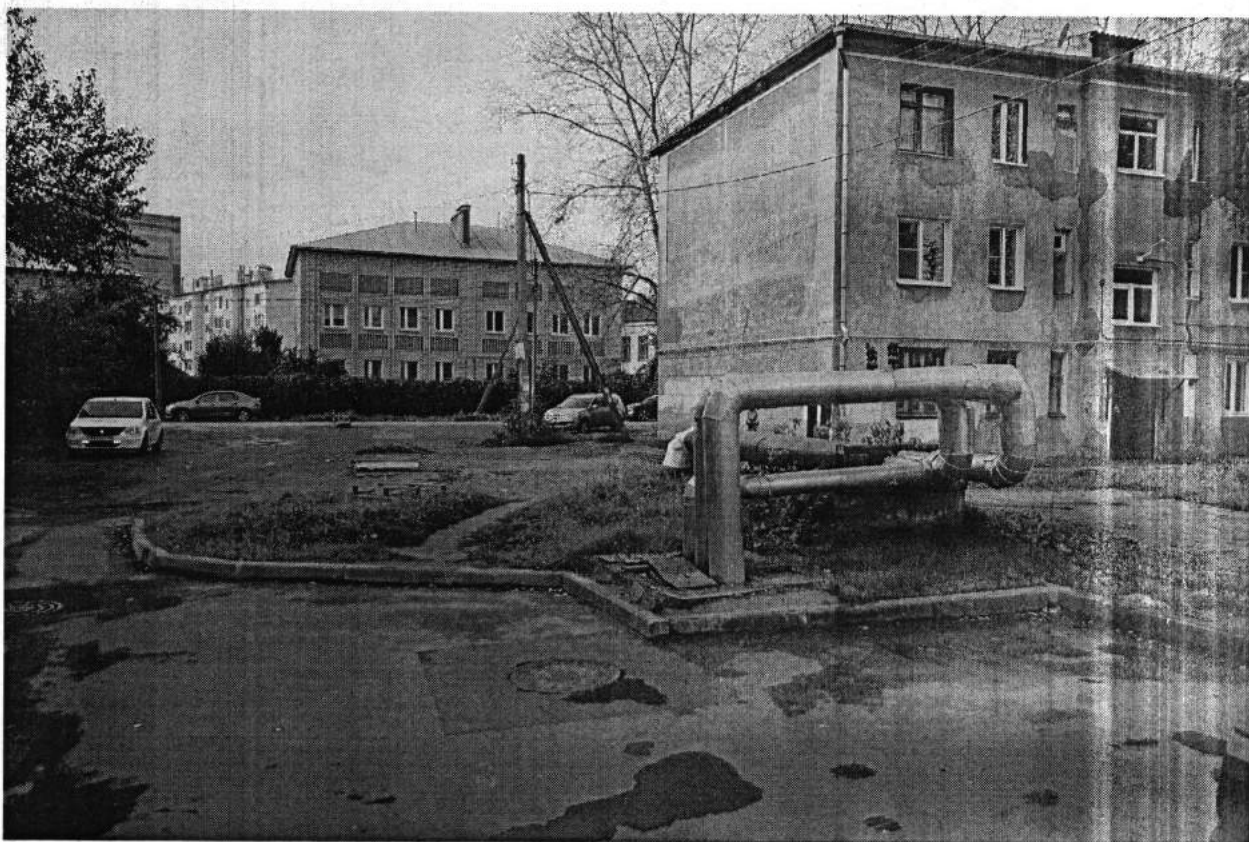


Фото 1. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск1-К88 (работы не ведутся)



Фото 2. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск8-ск11 (производство работ в районе камеры ск8)

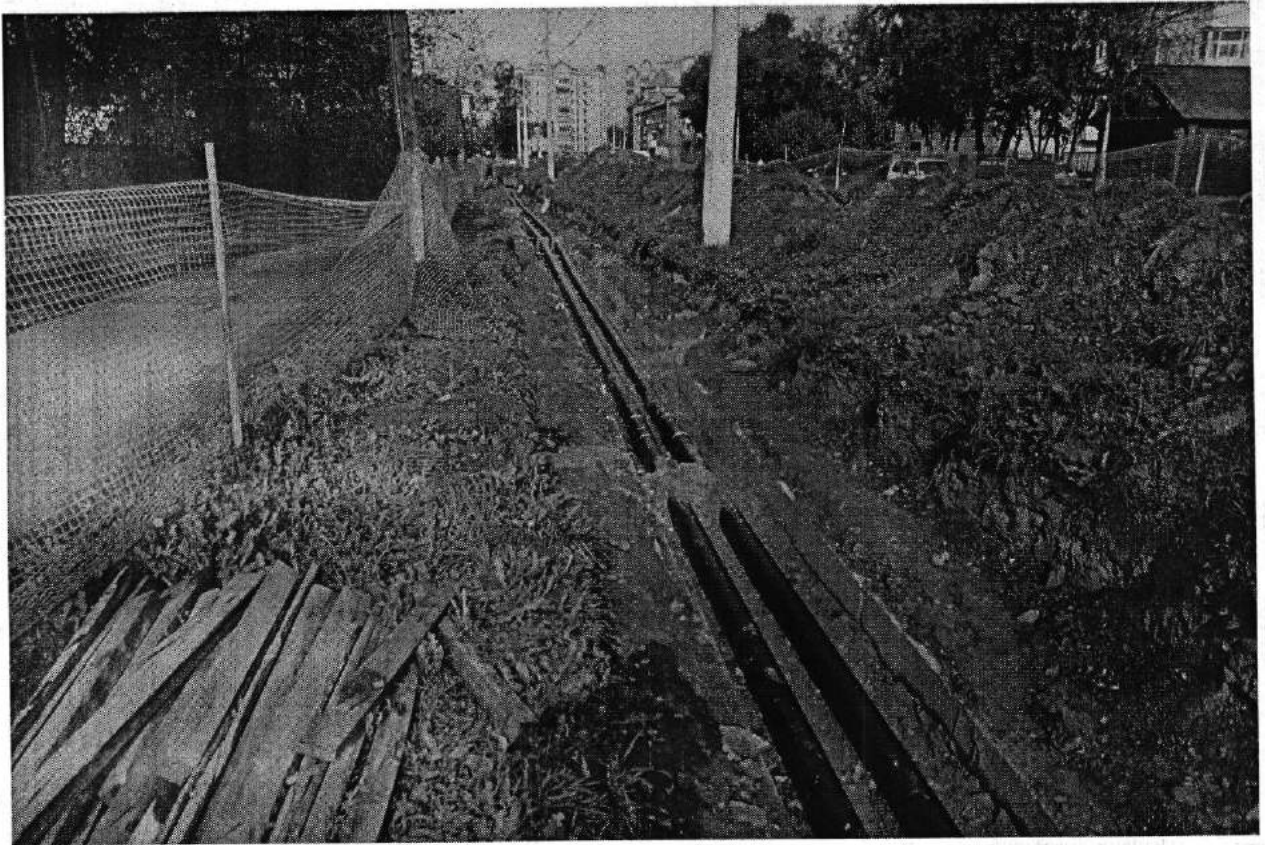


Фото 3. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск8-ск11  
(производство работ на участке от камеры ск8 до камеры ск11)



Фото 4. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск8-ск11 (П-образный компенсатор на участке от камеры ск8 до камеры ск11 развёрнут в сторону дорожного полотна по ул. Пушкина)





Фото 5. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск8-ск11  
(производство работ от камеры ск8 до камеры ск11)



Фото 6. Контроль производства работ на участке тепловой сети у ск11 (трассировка сетей  
осуществлена без использования камеры ск11)





Фото 7. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск11-ск12 (выход тепловой сети в районе камеры ск12 по направлению к многоквартирному дому №38 по ул. Пушкина)

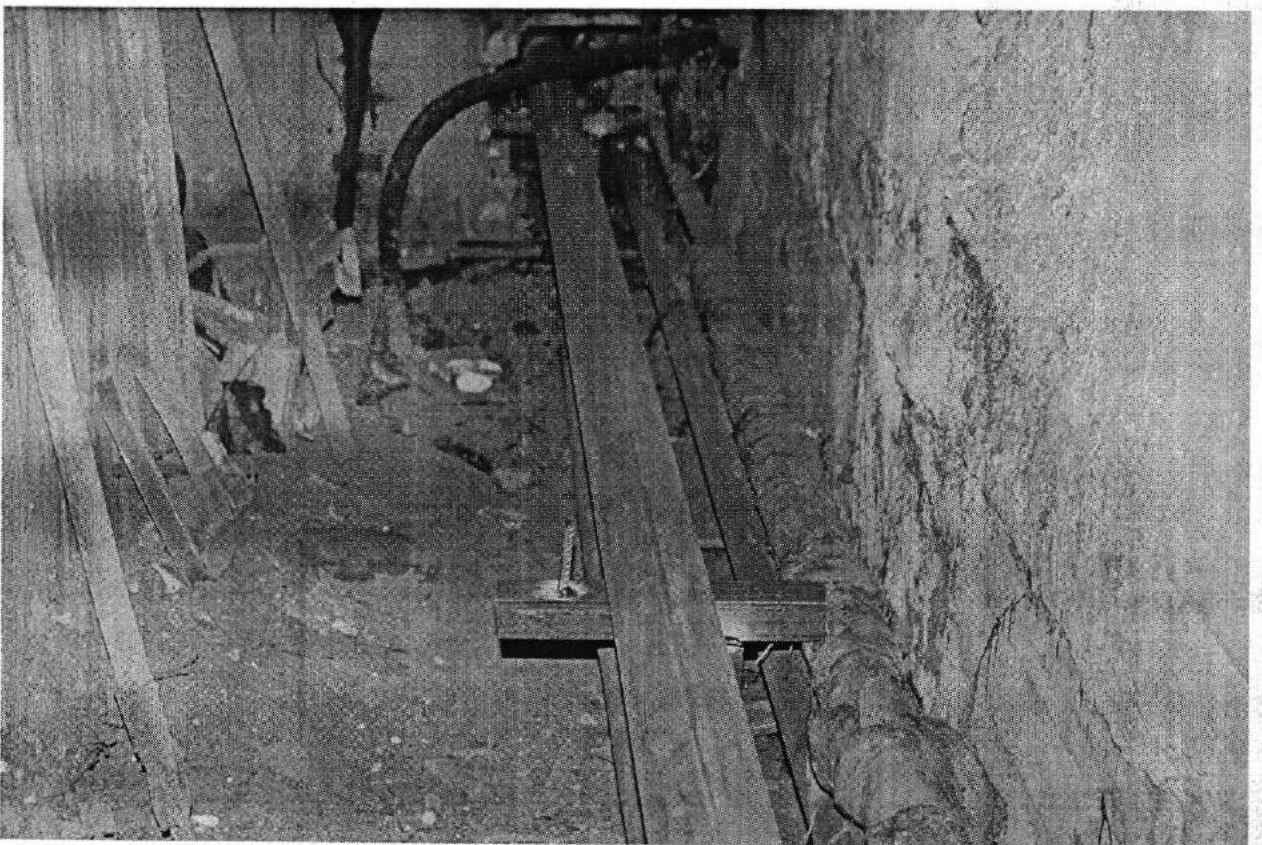


Фото 8. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск12-ск12а (транзит в подвале дома по адресу ул. Пушкина, 38)



Фото 9. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск12а-ск13 (участок между домами адресу ул. Пушкина, 38-40)



Фото 10. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск1-ввод в жилой дом по адресу ул. Ленина, 90 (ведётся производство работ)





Фото 11. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск1-ввод в жилой дом по адресу ул. Ленина, 90 (ведётся производство работ)

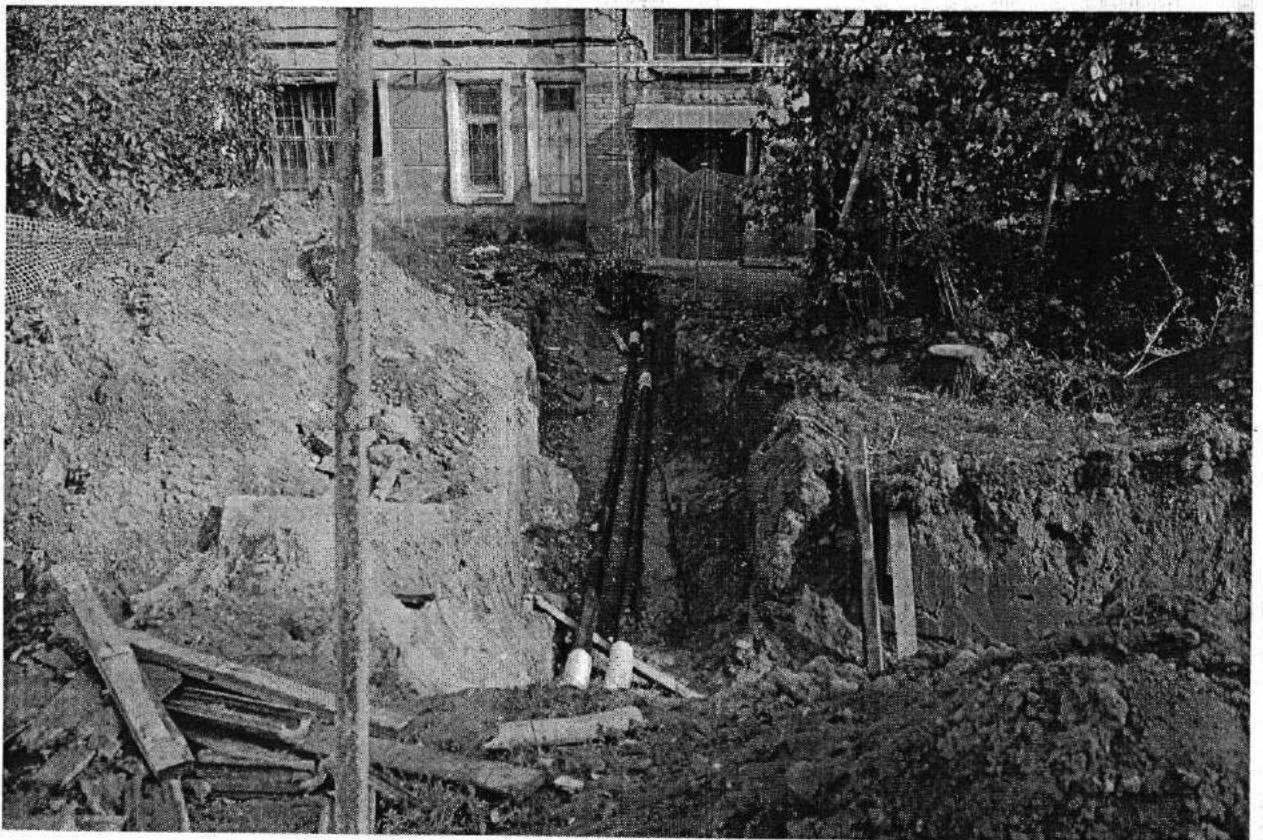


Фото 12. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск1-ввод в жилой дом по адресу ул. Ленина, 90 (ведётся производство работ)



## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 2/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-20а*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-20а по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: ООО ТГК-2 Энергоремонт, Назаров Игорь Николаевич*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

1. *Производство работ Концессионером осуществляется на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20а от ск4 до ввода в многоэтажный жилой дом по ул. Калиновская, 20 – ориентировочно 45 п.м. тепловых сетей в двухтрубном исчислении.*

*К 1.10.2019 г. производство работ на объекте контроля по Графику должно быть завершено, объект введён в эксплуатацию. Протяжённость участков производства работ на контролируемом объекте не соответствует плану выполнения мероприятий по Графику - в плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 207,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 81,0 п.м., в сентябре 126,0 п.м.).*

2. *Зафиксировано разрушение элементов тепловой сети - камер ск4, ск5, практически полностью демонтирована (отсутствует) кирпичная кладка двух из четырёх стен каждой камеры.*

3. *В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20а не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (производство работ и ввод в эксплуатацию утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей).*

по п2. В случае исключения из эксплуатации камер ск4, ск5 обосновать проектным решением, провести демонтаж выводимых из эксплуатации элементов тепловой сети и списание в соответствии с постановлением Администрации г. Костромы №1386 от 03.08.2009 г., иными действующими нормативно-техническими актами, внести необходимые изменения в паспорт БТИ на объект учёта (распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-20а).

по п3. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией, выполненные ранее работы проверить и привести в соответствие утверждённой проектной документацией.



Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения
2. Фотографии с места производства работ от 20.09.2019 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись)   
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись)   
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №2/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:



№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20а в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г, ввести объект в эксплуатацию	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	В случае исключения из эксплуатации камер ск4, ск5 обосновать проектным решением, провести демонтаж выводимых из эксплуатации элементов тепловой сети и списание в соответствии с постановлением Администрации г. Костромы №1386 от 03.08.2009 г., иными действующими нормативно-техническими актами, внести необходимые изменения в паспорт БТИ на объект учёта (распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-20а)	До 01.10.2019 г.	Концессионер
3	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер



Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи)



Фото 1. Контроль производства работ на участке тепловой сети у К-20а, между домами по адресу Калиновская, 22-24 (работы не ведутся)



Фото 2. Контроль производства работ на участке тепловой сети скЗ-К20а (работы не ведутся)





Фото 3. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск3  
(работы не ведутся)



Фото 4. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск3-ск4 (работы не ведутся)



Фото 5. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск4-ск5 (производство работ, вид от ск5 в сторону ск4)





Фото 6. Контроль производства работ на участке тепловой сети в районе ск4 (частичное разрушение кирпичной кладки стенок камеры ск4)



Фото 7. Контроль производства работ на участке тепловой сети в районе ск5 (частичное разрушение кирпичной кладки стенок камеры ск5)





Фото 8. Контроль производства работ на участке тепловой сети ск5-ввод в дом по адресу ул. Калиновская, 20



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 3/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-87*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-87 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 933,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 498,0 п.м., в сентябре 435,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 933,0, п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись)   
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись)   
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №3/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87 в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

   
(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

   
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 4/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-21*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-21 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 616,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 380,0 п.м., в сентябре 236,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 616,0, п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*





Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №4/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21 в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*


  
(подпись      *Евтухов А.В*  
расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

  
(подпись      *Чернов Д.А.*  
расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

  
(подпись      *Шахов А.В.*  
расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 5/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-21а*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-21а по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 763,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 440,0 п.м., в сентябре 323,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 763,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*


Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №5/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*


вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

  
(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

  
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 6/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральных тепловых камер К-78,78,80 влево*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральных тепловых камер К-78,78,80 влево по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Черноз Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведен контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-78,78,80 влево не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 144,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении для производства работ в сентябре 2019 г.*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-78,78,80 влево не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объектов контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 144,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплекты проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*




Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №6/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-78, 78, 80 влево в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

  
(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

  
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 7/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-82*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-82 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-82 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 641,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 270,0 п.м., в сентябре 371,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-82 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 641,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*



Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись)   
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись)   
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



**ПРЕДПИСАНИЕ**

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №7/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-82 в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

  
(подпись)   
расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

  
(подпись)   
расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 8/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г.

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-99*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-99 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-99 не производятся (не начаты).*

*К 1.10.2019 г. производство работ на объекте контроля по Графику должно быть завершено, объект введён в эксплуатацию. Протяжённость участков производства работ на контролируемом объекте не соответствует плану выполнения мероприятий по Графику - в плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 191,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 94,0 п.м., в сентябре 97,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-99 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (производство работ и ввод в эксплуатацию утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*





Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №8/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-99 в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г, ввести объект в эксплуатацию	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 9/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-100*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-100 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-100 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 785,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 387,0 п.м., в сентябре 398,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-100 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 785,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*


Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №9/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-100 в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



  
(подпись        
расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

  
(подпись        
расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

  
(подпись        
расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 10/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-101*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-101 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 606,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 296,0 п.м., в сентябре 310,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 606,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*





Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



   
(подпись)      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

   
(подпись)      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

   
(подпись)      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №10/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101 в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

   
(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

   
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера)

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)



## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 11/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-26*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-26 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26 не производятся (не начаты).*

*К 1.10.2019 г. производство работ на объекте контроля по Графику должно быть завершено, объект введён в эксплуатацию. Протяжённость участков производства работ на контролируемом объекте не соответствует плану выполнения мероприятий по Графику - в плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 866,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 463,0 п.м., в сентябре 403,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (производство работ и ввод в эксплуатацию утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



**ПРЕДПИСАНИЕ**

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №11/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26 в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г, ввести объект в эксплуатацию	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 12/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-25а*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-25а по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25а не производятся (не начаты).*

*К 1.10.2019 г. производство работ на объекте контроля по Графику должно быть завершено, объект введён в эксплуатацию. Протяжённость участков производства работ на контролируемом объекте не соответствует плану выполнения мероприятий по Графику - в плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 947,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 548,0 п.м., в сентябре 399,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25а не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (производство работ и ввод в эксплуатацию утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*




Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись)   
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись)   
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатах контроля №12/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25а в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г, ввести объект в эксплуатацию	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 13/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-42*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-42 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 609,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 362,0 п.м., в сентябре 247,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 609,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*



Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В



  
(подпись)   
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись)   
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись)   
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №13/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



 (подпись)  (расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

 (подпись)  (расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

 (подпись)  (расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 14/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-41*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-41 по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41 не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 652,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 352,0 п.м., в сентябре 300,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41 не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 652,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*




Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №14/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41 в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 15/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры К-14а*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры К-14а по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-14а не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 1036,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 594,0 п.м., в сентябре 442,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-14а не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствие с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 1036,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*


Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В


  
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись      расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись      расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №15/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*


вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-14а в соответствие с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*


(подпись)  (расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

(подпись)  (расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

(подпись)  (расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 16/20.09.2019

за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Дата составления: 23.09.2019 г

По адресу/адресам:

*Распределительные тепловые сети от магистральной тепловой камеры т.А, 7кв*

Предмет контроля;

*Выполнение мероприятий Концессионером на распределительных тепловых сетях от магистральной тепловой камеры т.А, 7кв по Графику мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г*

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

- председатель

*заместитель главного инженера Евтухов А.В.*

- члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

*«20» сентября 2019 г. был произведён контроль за соблюдением Концессионером ПАО ТГК-2 Костромские тепловые сети условий Соглашения в отношении выполнения Графика мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения от 03.07.2019 г, за период август-сентябрь 2019 г (далее - Графика).*

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

*Представитель Концессионера: отсутствовал*

В ходе проведения контроля, комиссией выявлено следующее:

*1. Работы Концессионером на участке распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры т.А, 7кв не производятся (не начаты).*

*В плане работ Концессионера на август-сентябрь 2019 г. утверждено 419,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в августе 231,0 п.м., в сентябре 188,0 п.м.).*

*2. В соответствии с требованиями п.18 концессионного Соглашения, Концессионер в установленном порядке и в сроки, обязан разработать и согласовать проектную документацию для создания, реконструкции объекта Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования для производства работ. Проектная документация на реконструкцию тепловых сетей от магистральной тепловой камеры т.А, 7кв не представлена (отсутствует).*

Требования к Концессионеру:

*по п1. Выполнить мероприятие в отношении объекта контроля в соответствии с утверждённым Графиком на август-сентябрь 2019 г. (начать производство работ утверждённых в Графике участков распределительных тепловых сетей и ввести в эксплуатацию к 01.10.2019 г. 419,0 п.м. распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении).*

*по п2. Разработать и согласовать в установленном порядке комплект проектной документации, производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.*



Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

заместитель главного инженера Евтухов А.В.



  
(подпись        
расшифровка)

Члены комиссии

начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.

  
(подпись        
расшифровка)

ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.

  
(подпись        
расшифровка)

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_

(подпись руководителя концессионера

расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение замечаний по результатам контроля за соблюдением условий проведения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения к Акту результатам контроля №16/20.09.2019

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, в составе:

Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*



вынесены следующие требования со сроками их устранения:

№ п/п	Требование	Срок устранения	Ответственный
1	Выполнить мероприятие по реконструкции распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры т.А, 7кв в соответствии с Графиком мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения, за период август-сентябрь 2019 г	До 01.10.2019 г.	Концессионер
2	Предоставить в МУП «Городские сети» комплект проектной документации на объект контроля (при отсутствии - разработать и согласовать в установленном Концессионным Соглашением порядке), производство работ осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией.	В течении 5 рабочих дней с момента получения настоящего предписания (п.75 Концессионного соглашения)	Концессионер

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель комиссии

*заместитель главного инженера Евтухов А.В*



   
(подпись      расшифровка)

Члены комиссии

*начальник производственно-технического отдела Чернов Д.А.*

   
(подпись      расшифровка)

*ведущий инженер производственно-технического отдела Шахов А.В.*

   
(подпись      расшифровка)

С Предписанием на устранение замечаний по результатам контроля ознакомлен(а), копию Предписания получил(а):

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя концессионера

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи)
